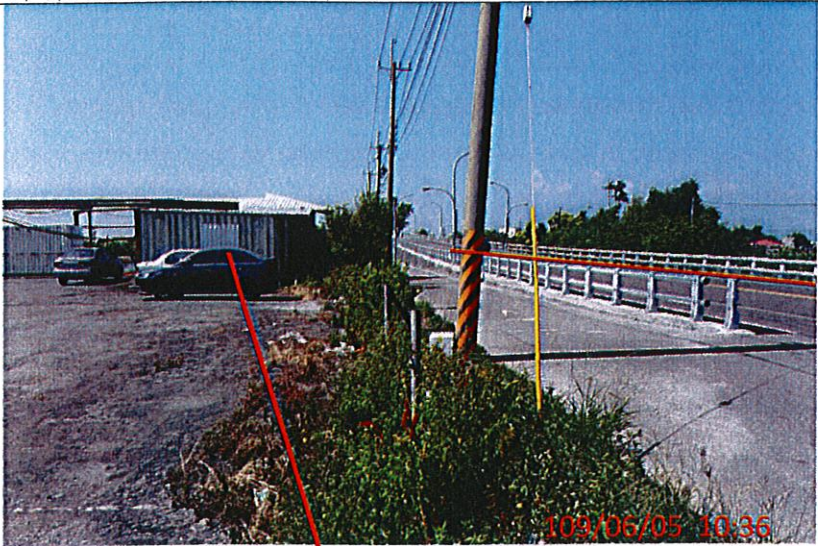


附件二

台2線153K+800~156K+000噶瑪蘭橋改建工程徵收土地使用情形表

| | |
|---|--|
| 一、使用情形調查日期 | 109年6月5日 |
| 二、核准徵收日期文號 | 99年10月27日 台內地字 第0990215330號函 |
| 三、公告徵收日期文號及公告期間 | 99年11月11日 府地用字 第0990161405A號函 公告期間自99年11月12日起至99年12月12日止 |
| 四、通知發價日期文號 | 99年11月11日 府地用字 第0990161405B號函 |
| 五、計畫書所載計畫進度 | <input checked="" type="checkbox"/> 預定 / <input type="checkbox"/> 業於100年1月開工，105年12月完工 |
| 六、實際開工日期 | <input type="checkbox"/> 已開工 (年 月 日) <input checked="" type="checkbox"/> 尚未開工 |
| 七、實際施工進度 | 預定進度 0 %，實際進度 0 % |
| 八、土地使用情形概述 | 尚未開工，目前辦理工程設計原則修正中，預計109年底蘭陽溪河川治理計畫公告後啟動設計及環評案補充調查，預計112年開工，115年完工。 |
| 九、彩色現況照片 (以紅線標示計畫範圍及標註攝日期；如範圍較大，應檢附足以呈現工程計畫實際進度之照片數量。) |  |
